

Јавно Комунално Претпријатие „ВОДОВОД“ н.Илинден



Јавно комунално претпријатие
ВОДОВОД
Бр. 01-49/1
18.02 2019 год.
н. Илинден, Илинден

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО
НА ЈКП "ВОДОВОД" н. Илинден
за период од 01.01-31.12.2018 година

Илинден, јануари, 2019 година



Јавно Комунално Претпријатие "ВОДОВОД" - н.Илинден

ул."9" б.б. нас.Илинден
Тел. 2572-671; факс:2550-578
Ж.с-ка: 300000002856783
ЕДБ: 4030008037559

Извештај за работата на ЈКП Водовод Илинден за периодот од 01.01-31.12.2018

За време на периодот од **01.01-31.12.2018 год.** Комуналното Претпријатие редовно ги извршуваше дејностите од својот делокруг на работење.

I Сектор Водовод


1.1 Корисници

Од водоводниот систем со чиста и здрава вода за пиење се снабдува населението од петнаесет населени места од териториите на три општини.

Број на корисници по општини

Општина	Физички лица			Правни субјекти			Дукани			Вкупно		
Состојба на:	01.01	31.12	Раст	01.01	31.12	Раст	01.01	31.12	Раст	01.01	31.12	Раст
Илинден	4608	4756	148	131	150	19	144	148	4	4883	5054	171
Гази Баба	1323	1404	81	13	13	/	23	25	2	1359	1442	83
Петровец	1078	1176	98	10	14	4	16	23	7	1104	1213	109
Вкупно	7009	7336	327	154	177	23	183	196	13	7346	7709	363

Процентуален приказ на бројот на корисниците по општини


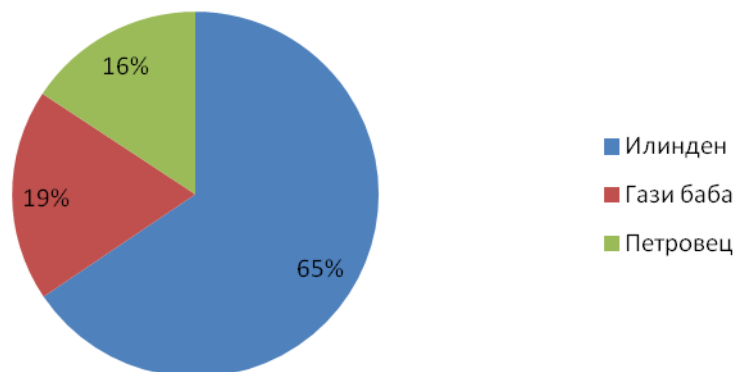


1.2 Испорака и снабдување со вода за пиење



Табеларен приказ на пласирана вода за пиење од пумпна станица Јурумлери кон населените места во три општини во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, изразено во м³						
Месеци	Ајватовци	ТИРЗ 1 Скопје	Бучинци	Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Јурумлери, Идризово, Дрма и Гоце Делчев	Петровец, Огњанци, Ржаничино и Којлија	Вкупно пласирана вода
Јануари	2 959 м³	11 680 м³	1 730 м³	115 741 м³	34 620 м³	166 730 м³
Февруари	2 652 м³	11 810 м³	1 492 м³	105 416 м³	26 320 м³	147 690 м³
Март	4 398 м³	12 510 м³	1 786 м³	116 221 м³	30 370 м³	165 285 м³
Април	5 640 м³	13 110 м³	1 839 м³	125 506 м³	31 400 м³	177 495 м³
Мај	4 891 м³	18 570 м³	2 121 м³	110 038 м³	37 310 м³	172 930 м³
Јуни	5 470 м³	18 630 м³	2 198 м³	167 632 м³	43 040 м³	236 970 м³
Јули	6 300 м³	20 000 м³	2 358 м³	144 982 м³	47 190 м³	220 830 м³
Август	7 289 м³	24 190 м³	2 262 м³	159 799 м³	40 880 м³	234 420 м³
Септември	7 001 м³	20 310 м³	2 170 м³	159 109 м³	23 740 м³	212 330 м³
Октомври	6 245 м³	17 960 м³	2 673 м³	132 872 м³	38 080 м³	197 830 м³
Ноември	6 314 м³	14 500 м³	2 133 м³	122 533 м³	31 120 м³	176 600 м³
Декември	6 071 м³	14 820 м³	1 875 м³	131 064 м³	32 970 м³	186 800 м³
ВКУПНО	65 230 м³	198 090 м³	24 637 м³	1 590 913 м³	417 040 м³	2 295 910 м³

Табеларен приказ на пласирана вода систем ОКТА во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година година, изразено во м ³			
Месеци	Миладиновци	Бујковци	Текија и Дељадровци
Јануари	9 770 м ³	7 001 м ³	2 260 м ³
Февруари	8 896 м ³	4 391 м ³	2 014 м ³
Март	10 025 м ³	4 582 м ³	2 343 м ³
Април	12 293 м ³	5 279 м ³	3 269 м ³
Мај	13 951 м ³	7 710 м ³	4 268 м ³
Јуни	13 109 м ³	5 261 м ³	3 609 м ³
Јули	16 106 м ³	6 622 м ³	4 321 м ³
Август	15 575 м ³	7 454 м ³	4 288 м ³
Септември	14 230 м ³	4 386 м ³	3 974 м ³
Октомври	12 894 м ³	5 226 м ³	4 569 м ³
Ноември	9 004 м ³	4 245 м ³	2 428 м ³
Декември	9 614 м ³	3 630 м ³	3 184 м ³
ВКУПНО	145 467 м³	65 787 м³	40 527 м³

Месеци	Табеларен приказ на пласирана и фактурирана вода кон Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Јурумлери, Гоце Делчев, Идризово и Дрма, изразено во м³		
	Пласирана вода	Фактурирана вода	Загуба на вода
Јануари	115 741 м³	63 138 м³	45,45%
Февруари	105 416 м³	52 575 м³	50,13%
Март	116 221 м³	56 575 м³	51,32%
Април	125 506 м³	63 969 м³	49,04%
Мај	110 038 м³	71 933 м³	34,63%
Јуни	167 632 м³	83 696 м³	50,07%
Јули	144 982 м³	79 135 м³	45,42%
Август	159 799 м³	80 501 м³	49,62%
Септември	159 109 м³	89 104 м³	44,00%
Октомври	132 872 м³	78 337 м³	41,04%
Ноември	122 533 м³	79 247 м³	35,33%
Декември	131 064 м³	71 464 м³	45,47%
ВКУПНО	1 590 993 м³	869 664 м³	45,34%

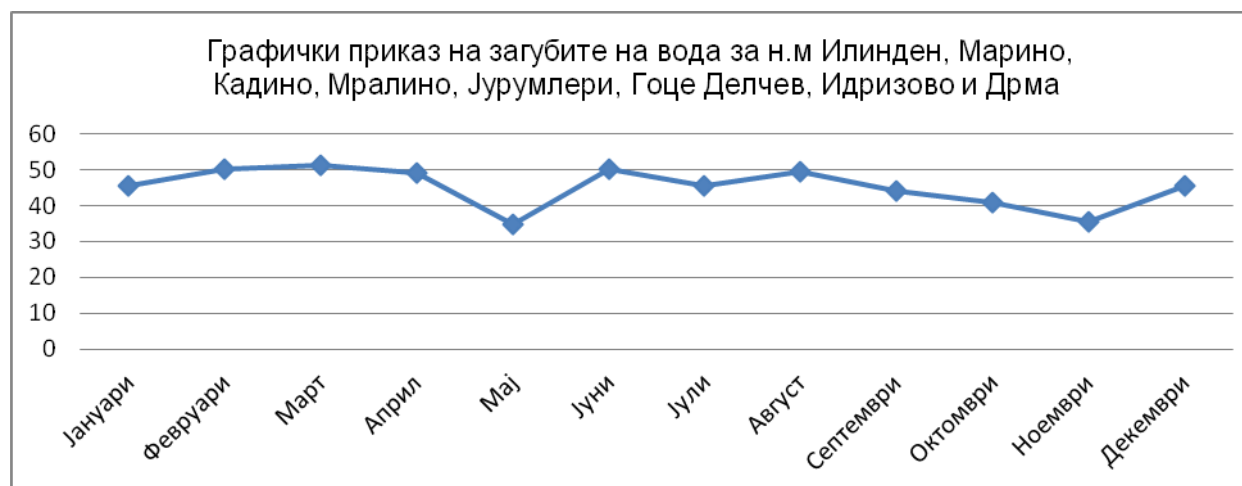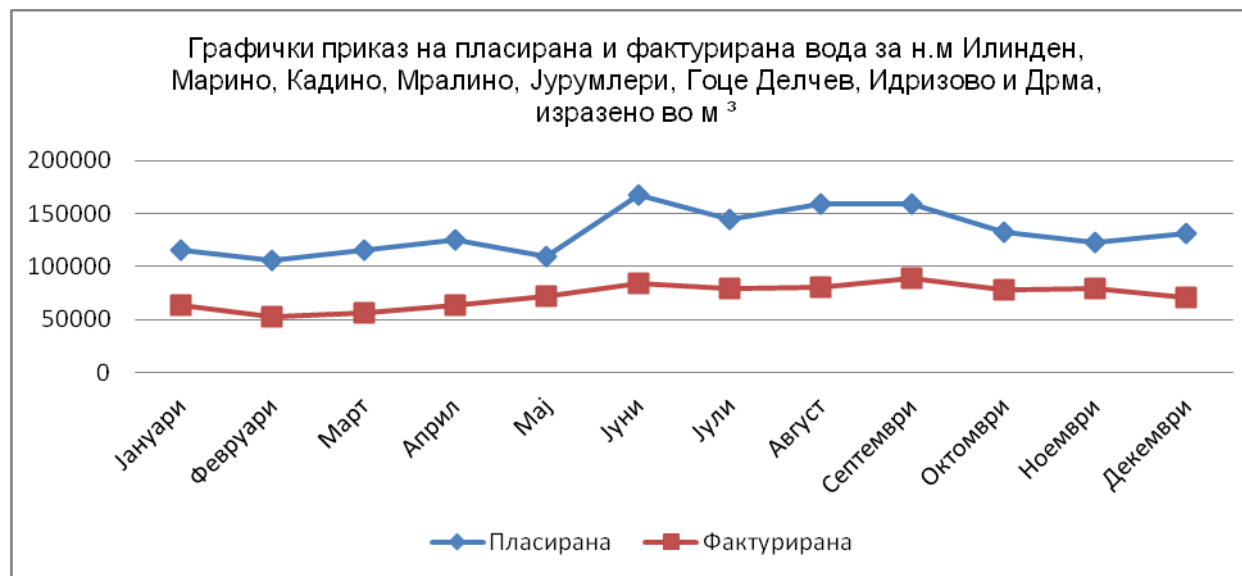


Табеларен приказ на пласирана и фактурирана вода од препумпна станица Бунарцик изразено во м³												
Месеци	Кон Ајватовци			ТИРЗ 1 Скопје			Кон Бучинци			Вкупно		
	Пласирана	Фактурирана	Загуба	Пласирана	Фактурирана	Загуба	Пласирана	Фактурирана	Загуба	Пласирана	Фактурирана	Загуба
Јануари	2 959 м³	3 156 м³	-6.66	11 680 м³	11 582 м³	0.84	1 730 м³	756 м³	56.30	16 369 м³	15 494 м³	5.35
Февруари	2 652 м³	2 681 м³	-1.09	11 810 м³	11 095 м³	6.05	1 492 м³	678 м³	54.56	15 954 м³	14 454 м³	9.40
Март	4 398 м³	3 517 м³	20.03	12 510 м³	11 161 м³	10.78	1 786 м³	682 м³	61.81	18 694 м³	15 360 м³	17.83
Април	5 640 м³	3 459 м³	38.67	13 110 м³	16 485 м³	-25.74	1 839 м³	674 м³	63.35	20 589 м³	20 618 м³	-0.14
Мај	4 891 м³	3 789 м³	22.53	18 570 м³	14 504 м³	21.90	2 121 м³	804 м³	62.09	25 582 м³	19 097 м³	25.35
Јуни	5 427 м³	3 784 м³	30.82	18 630 м³	16 399 м³	11.98	2 198 м³	873 м³	60.28	26 298 м³	21 056 м³	19.93
Јули	6 300 м³	3 896 м³	38.16	20 000 м³	16 049 м³	19.76	2 358 м³	892 м³	62.17	28 658 м³	20 837 м³	27.29
Август	7 289 м³	3 910 м³	46.36	24 190 м³	18 421 м³	23.85	2 262 м³	873 м³	61.41	33 741 м³	23 204 м³	31.23
Септември	7 001 м³	5 231 м³	25.28	20 310 м³	14 565 м³	28.29	2 170 м³	1 172 м³	45.99	29 481 м³	20 968 м³	28.88
Октомври	6 245 м³	4 497 м³	27.99	17 960 м³	16 400 м³	8.69	2 593 м³	1 045 м³	60.91	26 878 м³	21 942 м³	18.36
Ноември	6 314 м³	4 362 м³	30.92	14 500 м³	14 636 м³	-0.94	2 133 м³	772 м³	63.81	22 947 м³	19 770 м³	13.84
Декември	6 071 м³	3 188 м³	47.49	14 820 м³	16 297 м³	-9.97	1 875 м³	846 м³	54.88	22 766 м³	20 331 м³	10.78
ВКУПНО	65 230 м³	45 470 м³	30.29	198 090 м³	175 594 м³	10.35	24 637 м³	10 067 м³	59.14	287 957 м³	233 131 м³	19.05%

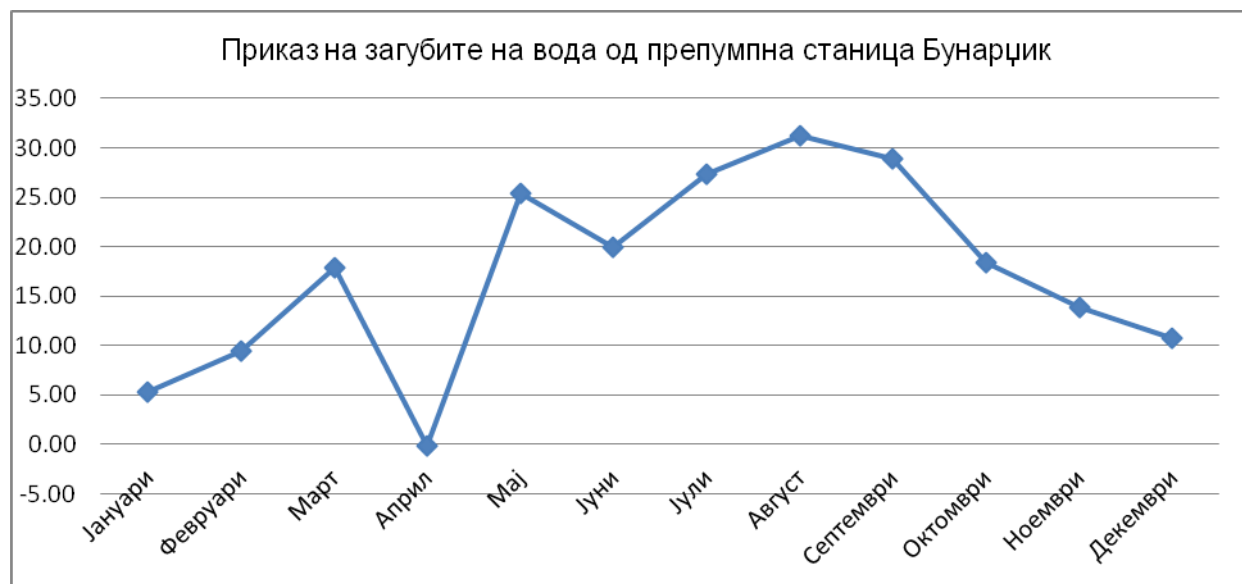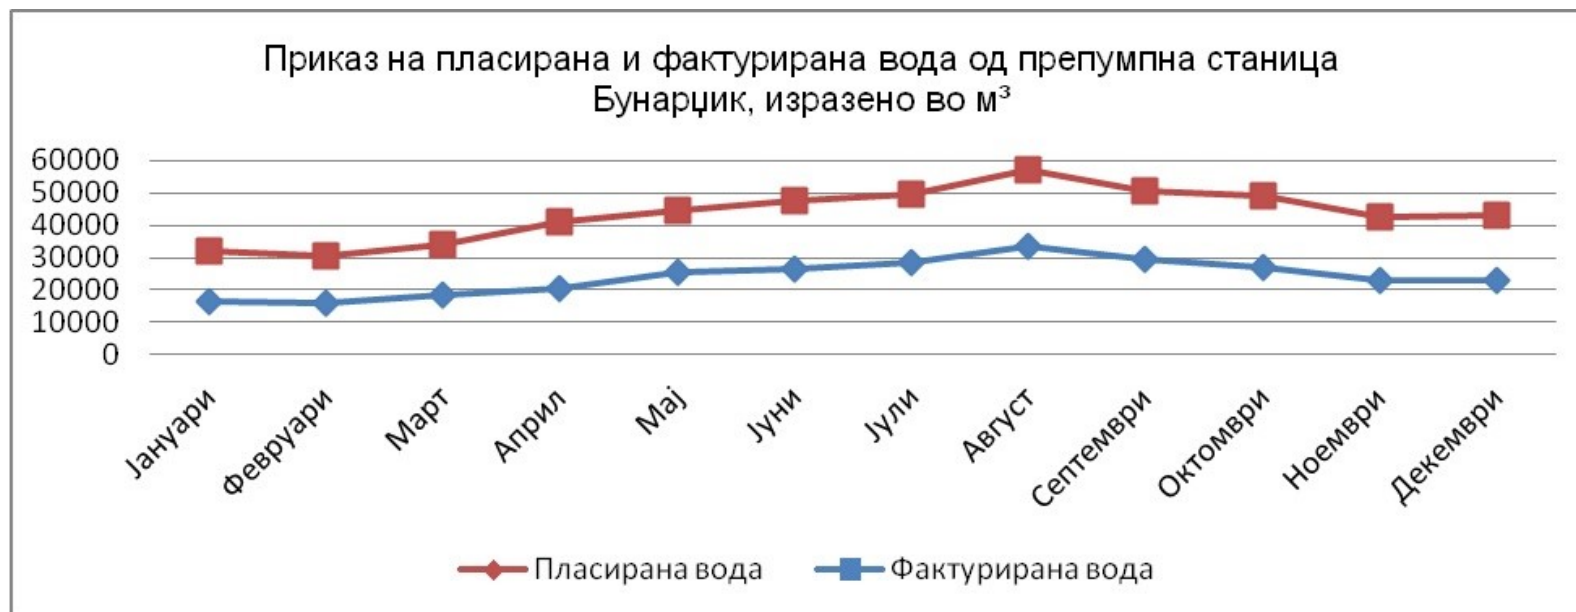


Табеларен приказ на пласирана и фактурирана вода од систем ОКТА изразено во м³												
Месеци	Миладиновци			Бујковци			Текија и Дељадровци			Вкупно		
	Пласирана	Фактурирана	Загуба	Пласирана	Фактурирана	Загуба	Пласирана	Фактурирана	Загуба	Пласирана	Фактурирана	Загуба
Јануари	9 770 м³	7 175 м³	26.56	7 001 м³	0	100.00	2 260 м³	2 244 м³	0.71	19 031 м³	9 419 м³	50.51
Февруари	8 896 м³	6 957 м³	21.80	4 391 м³	0	100.00	2 014 м³	1 958 м³	2.78	15 301 м³	8 915 м³	41.74
Март	10 025 м³	6 741 м³	32.76	4 582 м³	0	100.00	2 343 м³	1 986 м³	15.24	16 950 м³	8 727 м³	48.51
Април	12 293 м³	6 975 м³	43.26	5 279 м³	1 251 м³	76.30	3 269 м³	2 434 м³	25.54	20 841 м³	10 660 м³	48.85
Мај	13 951 м³	7 231 м³	48.17	7 710 м³	1 884 м³	75.56	4 268 м³	3 104 м³	27.27	25 929 м³	12 219 м³	52.88
Јуни	13 109 м³	7 751 м³	40.87	5 261 м³	2 620 м³	50.20	3 609 м³	3 208 м³	11.11	21 979 м³	13 579 м³	38.22
Јули	16 106 м³	7 736 м³	51.97	6 622 м³	2 240 м³	66.17	4 321 м³	3 238 м³	25.06	27 049 м³	13 214 м³	51.15
Август	15 575 м³	7 917 м³	49.17	7 454 м³	2 056 м³	72.42	4 288 м³	3 245 м³	24.32	27 317 м³	13 218 м³	51.61
Септември	14 230 м³	8 021 м³	43.63	4 386 м³	5 340 м³	-21.75	3 974 м³	2 847 м³	28.36	22 590 м³	16 208 м³	28.25
Октомври	12 894 м³	9 675 м³	24.97	4 569 м³	2 858 м³	45.31	5 226 м³	2 598 м³	43.14	22 689 м³	15 131 м³	33.31
Ноември	9 004 м³	10 523 м³	-16.87	4 245 м³	2 512 м³	40.82	2 428 м³	2 553 м³	-5.15	15 677 м³	15 588 м³	0.57
Декември	9 614 м³	9 410 м³	2.12	3 630 м³	1 716 м³	52.73	3 184 м³	2 496 м³	21.61	16 428 м³	13 622 м³	17.08
ВКУПНО	145 467 м³	96 112 м³	33.93	65 787 м³	22 477 м³	65.83	40 527 м³	31 911 м³	21.26	251 781 м³	150 500 м³	40.23

Загубата е изразена во проценти %

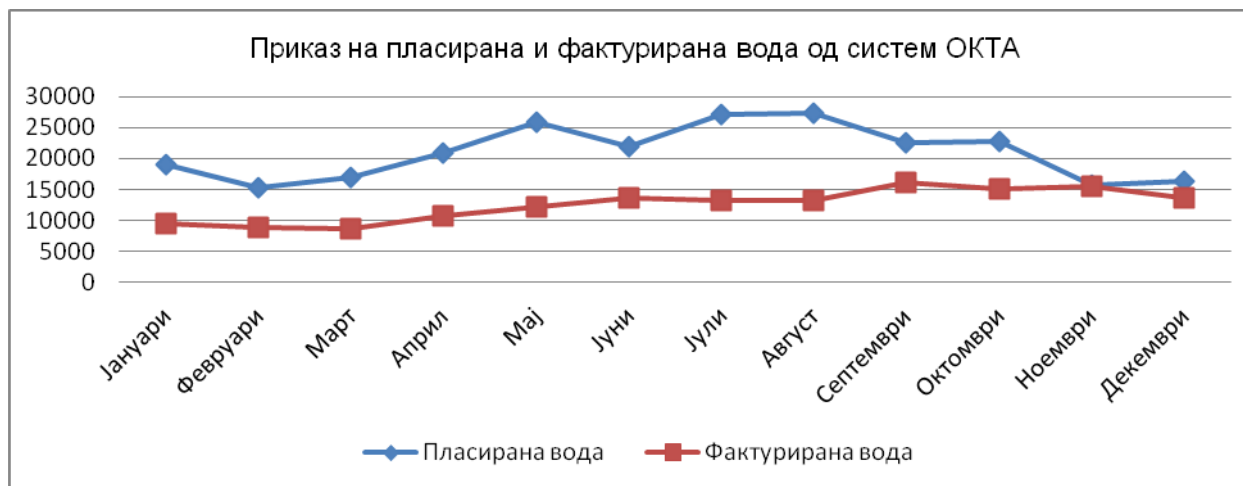

Табеларен приказ на пласирана и фактурирана вода кон Петровец изразено во м³			
Месеци	Пласирана	Фактурирана	Загуба на вода
Јануари	34 620 м³	12 766 м³	63.13
Февруари	26 320 м³	13 541 м³	48.55
Март	30 370 м³	13 133 м³	56.76
Април	31 400 м³	15 324 м³	51.20
Мај	37 310 м³	15 628 м³	58.11
Јуни	43 040 м³	12 205 м³	71.64
Јули	47 190 м³	16 187 м³	65.70
Август	40 880 м³	15 729 м³	61.52
Септември	23 740 м³	20 508 м³	13.61
Октомври	38 080 м³	17 808 м³	53.24
Ноември	31 120 м³	14 344 м³	53.91
Декември	32 970 м³	13 865 м³	57.95
ВКУПНО	417 040 м³	181 038 м³	59.59

Загубата е изразена во %

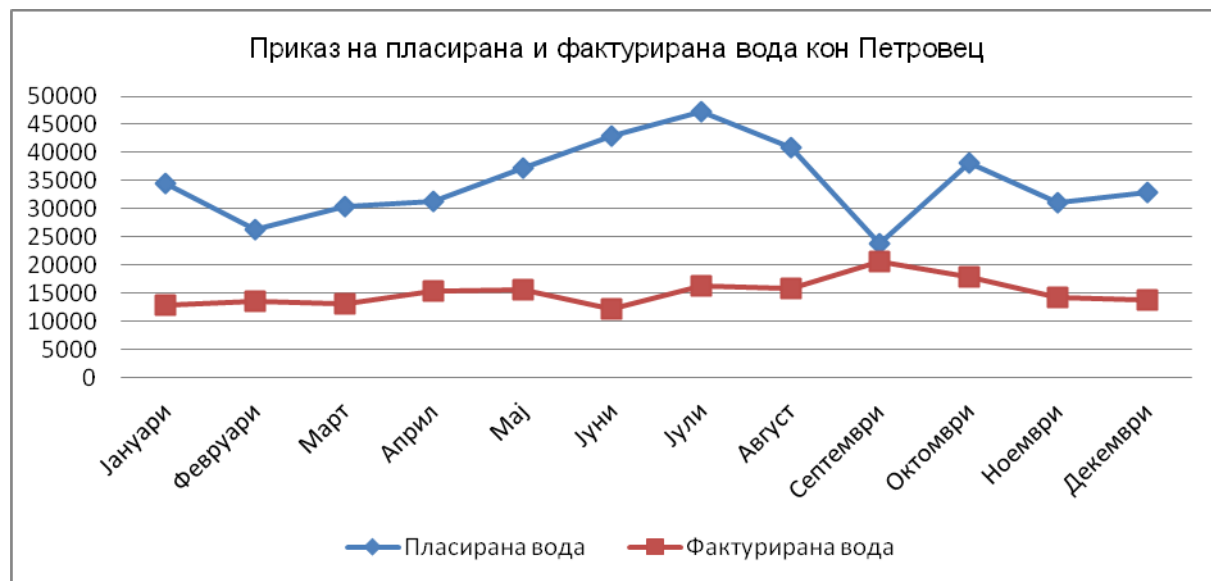

1.3 Наплата на побарувања за дистрибуирана вода

Споредбен приказ на **фактурирана и наплатена вода** во тек на две години изразено во денари

МЕСЕЦИ	2017 ГОДИНА			2018 ГОДИНА		
	Фактурирана	Наплатена	%	Фактурирана	Наплатена	%
Јануари	3 143 851, 00	2 782 363, 00	89%	3 246 376, 00	3 524 675, 00	109%
Февруари	3 206 627, 00	3 274 665, 00	102%	3 047 610, 00	2 646 959, 00	87%
Март	3 165 992, 00	3 421 828, 00	108%	3 106 996, 00	3 935 091, 00	127%
Април	3 379 480, 00	3 008 477, 00	89%	3 741 845, 00	3 154 588, 00	84%
Мај	3 769 794, 00	3 560 403, 00	94%	3 904 861, 00	3 737 633, 00	96%
Јуни	4 580 701, 00	2 693 426, 00	59%	4 256 871, 00	3 443 513, 00	81%
Јули	4 066 559, 00	4 860 205, 00	119%	4 466 624, 00	5 177 391, 00	116%
Август	4 318 104, 00	2 660 627, 00	62%	4 619 930, 00	3 722 498, 00	81%
Септември	4 983 385, 00	3 683 960, 00	74%	5 431 122, 00	4 248 248, 00	78%
Октомври	4 983 385, 00	3 683 960, 00	74%	4 774 484, 00	5 234 177, 00	110%
Ноември	4 081 025, 00	4 193 373, 00	103%	4 733 143, 00	4 254 227, 00	90%
Декември	3 486 469, 00	4 691 454, 00	135%	4 643 993, 00	4 971 987, 00	107%
ВКУПНО	45 681 987,00	43 730 781,00	95,7%	49 973 855, 00	48 050 987, 00	96,15

Инвестиционо **одржување и проширување** на примарен и секундарен **водоводен систем**

- **Тековно одржување на примарен водовод**

Секојдневна проверка на главните линии, контрола- визуелна и звучна и контрола на притисок во следниве населени места

- Ф280-225 н.м Јурумлери, н.м Илинден (Шамак), н.м Марино, Зона Бунарџик
- Ф280 н.м Марино, н.м Кадино
- Ф225 н.м Илинден Стопански комплекс

- Во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година санирани се вкупно **61 дефекти** на примарниот вод.

- Примарен вод н.м.Илинден -----16 дефекти
- Примарен вод Јурумлери ----- 2 дефекти
- Примарен вод Јурумлери-Шамак -----8 дефекти
- Примарен вод н.м.Марино -----5 дефект
- Примарен вод н.м.Кадино -----17 дефекти
- Примарен вод н.м.Бунарџик -----4 дефекти
- Примарен вод н.м.Бунарџик - ТИРЗ -----2 дефекти
- Примарен вод н.м.Дељадровци -----1 дефекти
- Примарен вод н.м Петровец-----3 дефекти
- Примарен вод н.м Јака-----1 дефект
- Примарен вод н.м Ржаничино-----2 дефект

- **Тековно одржување на секундарен водовод**

- Отстранување на **405 дефекти** на секундарен вод и дефекти на приклучоци до крајни корисници.
- Сервисирање на ситни дефекти.

- **Инвестиционо проширување на примарен водоводен систем**

- **Вкупното проширување на примарната водоводна мрежа** во периодот од 01.01.2018-30.09.2018 година **изнесува 1650 метри**
- *Стопански Комплекс 32, Јака*- проширување во должина од 1400 метри, главна линија Ф110
- Дислокација на главна водоводна линија за *Стопански комплекс, Илинден* во н.м Илинден, Ф110 во должина од 250 метри

- **Инвестиционо проширување на секундарен водоводен систем**

- **Вкупното проширување на секундарната водоводна мрежа** во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година **изнесува 2018 метри**
- **н.м.Илинден - проширување во вкупна должина од 972 метри;**
 - Ф110 во должина од 357 метри во Локалитет Ограѓа кај Мултипром
 - Ф110 во должина од 48 метри на ул.9 н.м.Илинден
 - Ф110 во должина од 15 метри на ул.9 н.м.Илинден (пред ОУ Гоце Делчев)
 - Ф90 - 300 метри од ул.11 до Лок.Ограѓа н.м.Илинден
 - Ф1" во должина од 150 метри за Макпетрол во н.м.Илинден (м.в.Пилот)
 - Ф100 проширување во должина од 30 метри, главна линија (линија од шахтата кај пианата до правен субјект Апетитко)
 - Ф63 во должина од 72 метри за поставување на приклучок за домаќинство
- **н.м.Марино - проширување во вкупна должина од 103 метри;**
 - Ф63 во должина од 10 метри во Локалитет 15 н.м.Марино
 - Ф5/4" во должина од 84 метри за поставување на приклучок за домаќинство во н.м.Марино
 - Ф63 во должина од 4 метри за поставување на приклучок за домаќинство
 - Ф110 во должина од 5 метри за поставување приклучок за домаќинство
- **н.м.Кадино - проширување во вкупна должина од 263 метри;**
 - Ф63 во должина од 70 метри на ул.11 н.м.Кадино
 - Ф1" во должина од 55 метри за поставување на приклучок за домаќинство
 - Ф110" во должина од 8 метри за приклучок за домаќинство
 - Ф90 во должина од 130 метри за поставување приклучок за правен субјект кај фудбалско игралиште
- **Лок.ЈАКА - проширување во вкупна должина од 572 метри;**
 - Ф3/4" во должина од 465 метри за гробиштата во Јака

- Ф1" во должина од 107 метри за поставување на приклучок за домаќинство во Јака
- **Н.м Ајватовци- проширување во вкупна должина од 78 метри**
 - Ф5/4 во должина од 78 метри за поставување на приклучок за домаќинство
- **ТИРЗ 1 Скопје- проширување во вкупна должина од 30 метри**
 - Ф110 во должина од 30 метри за поставување на приклучок за правен субјект

Позначајни активности во Одделение за водовод

1. Замена на главна водоводна линија со ПЕ цевки Ф160 25 бари во кругот на Препумпна станица во н.м.Бунарџик во должина од 90 метри;
2. Замена на водоводната линија со ПЕ црево Ф63 во н.м.Дељадровци во должина од 70 метри;
3. Дислокација на водоводна линија со ПЕ цевки Ф90 во н.м.Ајватовци во должина од 80 метри;
4. Преместување на приклучок со ПЕ црево од 1" за Макпетрол во н.м.Илинден (м.в.Пилот) во должина од 150 метри;
5. Замена на два дотраени воздушни вентили Ф80 на главниот вод Ф280 во место викано Шамак;
6. Монтиран е нов ПЗ вентил Ф250 во н.м.Кадино (млин Крива река) и нов ОЗ вентил Ф65 во н.м.Бујковци;
7. Извршено е прочистување (air lifting) на Бунар 4 во Пумпна станица Јурумлери;
8. Монтирана е нова потопна потисна пумпа со електромотор со моќност од 37 kW во Бунар 2 во Пумпна станица Јурумлери;
9. Извршено е чистење и дезинфицирање на двете комори на резервоарот во препумпна станица Бунарџик;
10. Набавено е патничко моторно возило.
11. Во н.м Илинден на ул.15 направено е премостување на водоводната линија Ф63 и на ул.19 н.м Илинден на главна линија Ф90. Освен премостувањето на оваа линија направено е премостување и на два приклучоци за физички лица на истата улица.
12. Монтирани се ПЗ вентил на главна линија Ф90 на ул.15 и ул.23 н.м Илинден.
13. Поправен е регулатор за притисок во Миладиновци во шахта.
14. Монтиран е хидрант во н.м Илинден, ул.9, на главна линија Ф110.
15. Поправени се повеќе нефункционални шибер вентили на територијата на општина Илинден и општина Петровец
16. Монтирана е вертикална моторна пумпа тип Shackti во препумпна станица Бунарџик, за препумпување на вода за н.м Бучинци.
17. Заменета инсталација за постоечка фонтана во н.м Миладиновци (на местото на поцинкованите цевки поставени се ППР цевки во должина од 1,5 метри.
18. Модернизирање на системот за хлорирање за н.м Миладиновци и Бујковци. Поставен е нов систем за автоматско хлорирање на водата а постоечкиот систем е оставен како дополнителен во случај да треба да се активира. Постигнат е оптимален притисок на водата за крајните корисници за н.м Бујковци


Број на поднесени барања за реализација на водоводен приклучок	Реализирани барања за водоводен приклучок	Процент на реализација
128	66	51,56%
Барања за одвојување	Реализирани одвојувања	
20	14	70%

Број на поднесени барања за населено место Јака	Реализирани барања	Процент на реализација	Извршени уплати
45	16	35,5 %	27

II Сектор Канализација

2.1 Корисници


Број на корисници во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година по прочистителни станици												
Населено место	Физички лица			Правни субјекти			Дукани			Вкупно		
Период	01.01	31.12	Раст	01.01	31.12	Раст	01.01	31.12	Раст	01.01	31.12	Раст
Илинден ПП7	180	269	89	7	10	3	1	2	1	188	281	93
Марино ПП2	456	471	15	4	6	2	14	13	/	474	490	16
Марино ПП1	/	177	177	/	6	6	/	4	4	/	187	187
Кадино ПП4	108	185	77	4	4	/	10	11	1	122	200	78
Вкупно	744	1102	358	15	26	7	25	30	5	784	1158	374

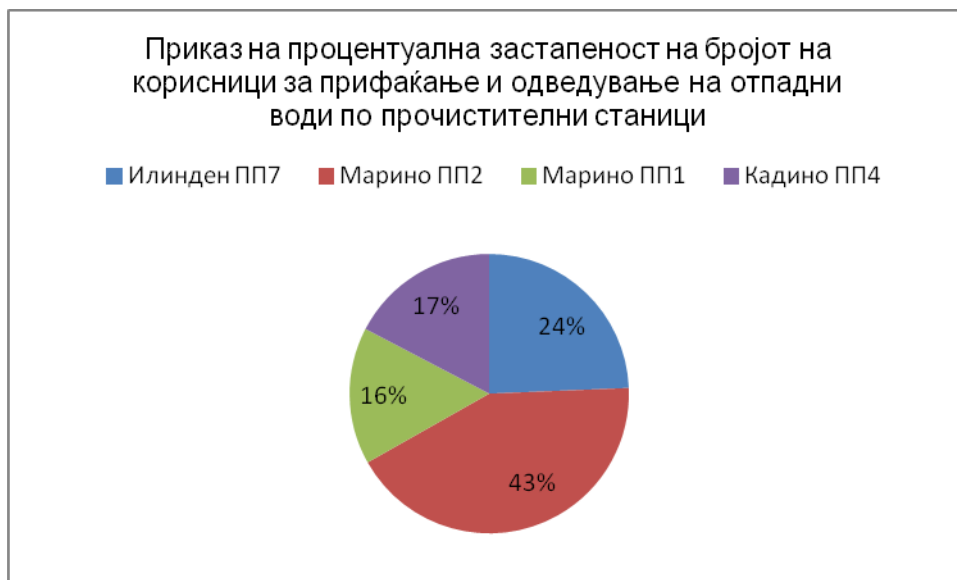

2.2 Прифаќање и третман на отпадни води


Споредбен приказ на прифатена и прочистена отпадна вода изразено во м³

Месеци	Илинден ПП7	Кадино ПП4	Марино ПП1	Марино ПП2	ВКУПНО
Јануари	2264	1278	0	4892	8434
Февруари	1728	1173	0	5158	8059
Март	1716	1159	0	5088	7963
Април	2082	3405	1307	5428	12222
Мај	2423	2896	2083	5748	13150
Јуни	2103	3337	2439	6519	14398
Јули	2442	3068	2451	6528	14489
Август	2276	3105	2473	6706	14560
Септември	4008	2807	2425	7265	16505
Октомври	3649	3569	2089	6203	15510
Ноември	3992	3470	2108	5846	15416
Декември	3695	4296	1943	5154	15088
ВКУПНО	32378	33563	19318	70535	155794

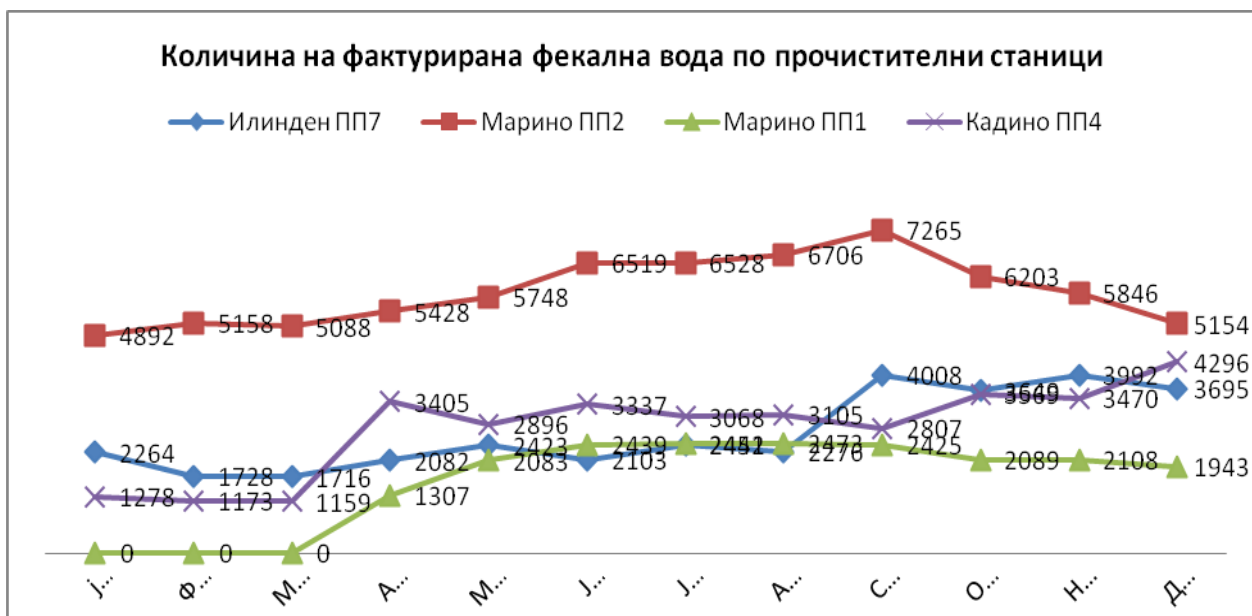

2.3 Наплата на побарувања за прифатена и прочистена фекална отпадна вода

МЕСЕЦИ	2017 ГОДИНА			2018 ГОДИНА		
	Фактурирана	Наплатена	%	Фактурирана	Наплатена	%
Јануари	52 350. 00	54 288. 00	103.7	93,424.00	88,920.00	95.18
Февруари	67 164. 00	58 813. 00	87.6	84,950.00	80,588.00	94.87
Март	63 424. 00	58 667. 00	92.5	130,372.00	124,171.00	95.24
Април	72 307. 00	52 618. 00	72.8	234,332.00	201,699.00	86.07
Мај	73 504. 00	64 164. 00	87.3	237,070.00	177,677.00	74.95
Јуни	94 047. 00	75 623. 00	80.4	256,939.00	157,204.20	61.18
Јули	97 981. 00	96 571. 00	98.6	251,028.00	214,601.14	85.49
Август	97 279. 00	69 359. 00	71.3	258,043.00	194,878.84	75.52
Септември	115 675.00	76 997. 00	66.6	306,650.00	229,752.00	74.92
Октомври	93 054. 00	94 765. 00	101.8	287,265.00	270,512.21	94.17
Ноември	81 719. 00	116 234.00	142.2	349,578.00	293,734.00	84.03
Декември	89 419.00	140 000.00	156.56	308,630.00	249,072.00	80.70
ВКУПНО	997 923, 00	958 099, 00	96.0	2,798,281.00	2,282,809.39	81.58

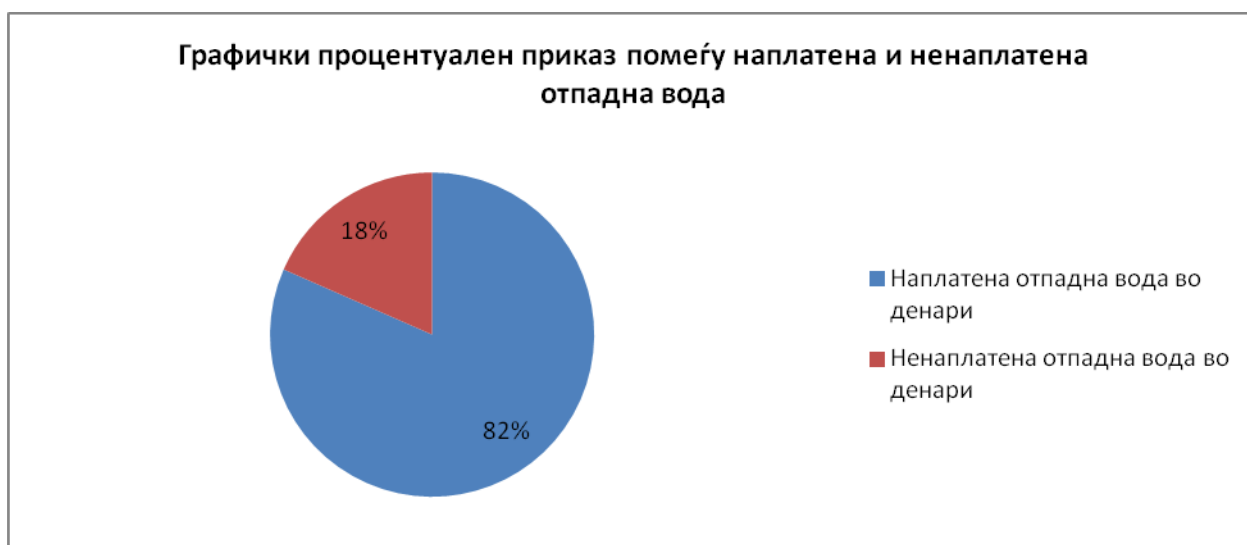

Јавното Комунално Претпријатие “Водовод” н.Илинден стопанисува со изградените и функционални канализациони системи за прифаќање и третман на отпадните води во населените места Илинден, Марино и Кадино.

Карактеристики на прочистителните станици				
Прочистителна станица	Илинден ПП7	Марино ПП1	Марино ПП2	Кадино ПП4
Вкупен број на корисници	280	183	490	200
Дневен капацитет	190 м³	190 м³	120 м³	190 м³
Вкупна должина на канализациона мрежа	3870 метри	4040 метри	7536 метри	3246 метри
Изградена канализациона мрежа	270 метри	160 метри	40 метри	125 метри
Број на препумпни уреди	7	2	1	3
Број на ревизиона шахта	102	94	188	110

Позначајни активности во одделение за Канализација

- Секојдневна проверка на препумпните уреди и прочистителните станици во н.м Илинден, н.м Марино и н.м Кадино.
- Проверка на ревизионите шахти во сите ПС во соодветните населени места
- Повеќекратно исцрпување на насобран талог во ППУ 1 ул.518 н.м Марино, ПП1 со цистерна од ЈКП. По исцрпувањето направено е перење со вода од хидрант.
- Бетонирање на шахти, капаи и прстени за истите, на линијата за фекална канализација на потегот ОУ Гоце Делчев-ПУ2 Илинден. Поставени се 10 приклучоци за физички лица и 2 приклучока за правни субјекти
- Поради затнување на канализационата линија, предизвикана од нагмеченост на цевка ф 200 на ул.527 во н.м Марино, извршено е машинско ископување на теренот и поставување на нови цевки во должина од 16 метри. По санација на проблемот, линијата е доведена до функционалност и околината е вратена во првобитната состојба
- Редовно чистење на линијата на улиците 513, 518 и 529 н.м Марино со цистерна под притисок и црпење на вода со истата
- Поради проблеми со автоматиката на ПС Марино, ПП1 извршено е комплетно преспојување на електриката како на сите пумпи така и на пловците кои што ја контролираат работата на истите, откако се направи преспојувањето извршено е набљудување на два комплетни процеси. Истите се во ред и прочистителната станица функционира нормално.
- Во третиот квартал во н.м Илинден на ул.15 поставени се 26 приклучоци за физички лица,
- Во четвртиот квартал во н.м Илинден, на улица 19 поставени се 24 приклучоци за физички лица. За поставување на приклучоците направени се вкупно 12 пресеци преку асфалт, исто така во н.м Марино на веќе изградената линија за фекална канализација на улица 518 приклучени се 13 домаќинства а на улица 513 реализиран е еден приклучок.
- Рачно е исчистен канал реципиент околу 250 метри во н.м Илинден, ПП7
- Изградба на магацински простор во дел на ПС 7 н.м Илинден
- Изградена е ограда на прочистителните станици во н.м Илинден, Марино и Кадино. При тоа на сите прочистителни станици и препумпни уреди поставени се информативни табли за нивно обележување.
- Во соработка со бизнис секторот од Локалитет 14 и 15 н.м Марино, изградена е фекална канализациона мрежа во должина од 160 метри на која се приклучени 4 правни субјекти. Материјалните средства се обезбедени од страна на бизнис сектор а инсталирањето е извршено од страна на стручен сектор од ЈКП “Водовод” н.Илинден

Вкупни ненаплатени побарувања заклучно со 31.12.2018 година

Ненаплатени побарувања	Вкупно
Побарувања од фирми	6.768.807,50
Побарувања од физички лица	11.707.271,35
Побарувања од дуќани	951.186,32
Вкупно	19.427.265,17

Утужени побарувања	Вкупен износ
	4.115.531,11

Годишен извештај на ненамирени обврски

Ненамирени обврски	Вкупен износ
	2.582.253,00

Забелешка: Неисплатените обврски над 60 дена претежно се однесуваат на обврските кон Рафинерија на нафта АД ОКТА за периодот од 06.2013 година до 12.2018 година во износ од 1.634.797,00 денари.

- Застапување на претпријатието пред надлежните судови, мерки за зголемување на наплатата
 - **229** Предлози за донесување на решенија за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, за физичките лица - корисници на услугите за водоснабдување на претпријатието,
 - **1** Предлог за донесување на решенија за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, за правни лица - корисници на услугите за водоснабдување на претпријатието.
- 1. Редовно се земаа мостри за физичко- хемиска и микробиолошка анализа на водата за пиење и отпадната вода
- 2. Во ситемот за електронска градежна дозвола беа издадени 159 мислења за хидротехнички услови.
- 3. Реализирани се санитарни прегледи за вработените на Пумпни станици и резервоари
- 4. Одржани состаноци за регулирање на договорот за превземање на водоводниот систем со кој стопанисува ОКТА АД Скопје, помеѓу општина Илинден, ОКТА АД Скопје и ЈКП Водовод н. Илинден во кој беше консултирана и Регулаторна комисија за енергетика на Р.Македонија.
- 5. Доставени 3153 опомени до физички лица со поголем број ненаплатени побарувања за потрошена вода и 51 опомена за дуќани
- 6. Од планираните 34, реализирани се вкупно 28 постапки за јавни набавки

Илинден, 11.01.2019 год

ЈКП „ВОДОВОД“ н.Илинден
В. Д Директор
Сашо Саздовски

